



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2021 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-29/21-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE PASEO DE RINCONADA Y PASEO DE LA ESTACIÓN, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE PASEO DE RINCONADA Y PASEO DE LA ESTACIÓN, COL. PASEO DE CAPELLANÍA. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-29/21-IR DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>21 DE MAYO DE 2021.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-29/21-IR DE 21 DE MAYO DE 2021.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,839,413.13</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 69,208.28</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,908,621.41</u>



Contratista: SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/05/2021 Fecha de terminación: 06/08/2021
Fecha real de inicio: 24/05/2021 Fecha real de terminación: 16/07/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA, BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2558566 21 DE MAYO DE 2021
Importe: \$183,941.31
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2558553 21 DE MAYO DE 2021
Importe: \$551,823.94
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2558566 19 DE JULIO DE 2021
Importe: \$6,920.83
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2558566 21 DE MAYO DE 2021
Importe: \$183,941.31
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$1,859,872.04	\$1,859,872.04	\$1,859,872.04	-	-
Inversión Ejercida	\$1,908,621.41	\$1,908,621.41	\$1,908,621.41	-	-
Saldo	-\$48,749.37	-\$48,749.37	-\$48,749.37	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$551,823.94**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/05/21 AL 22/06/21	255,674.74	596,574.40
01 ADITIVA	24/05/21 AL 22/06/21	50,834.25	118,613.25
02 NORMAL	23/06/21 AL 07/07/21	244,256.71	569,913.75
02 ADITIVA	23/06/21 AL 07/07/21	1,058.23	2,469.22
03 NORMAL	08/07/21 AL 16/07/21	0.00	69,226.85
	Sub-Total	\$551,823.93	1,356,797.47
		Total	\$1,908,621.41

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




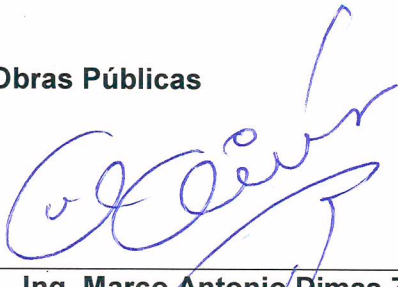
9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **18** de **AGOSTO DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. **Cipriano Torres García**
Director General de Obras Públicas


Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Arq. **Andrea Alejandra Reyna Gallegos**
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. **Liliana Torres González**
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Claudia **Esperanza Torres Padilla**
Representante Legal
SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-29/21-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**
