



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-48/20-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES EN AV. LAS TORRES , COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. LAS TORRES, COL. BALCONES DE GARCÍA.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-48/20-IR DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>08 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-48/20-IR DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,271,120.05</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 136,816.45</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,407,936.50</u>



Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **09/09/2020** Fecha de terminación: **07/12/2020**
 Fecha real de inicio: **09/09/2020** Fecha real de terminación: **04/11/2020**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE DE 8.00 X 8.00M, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X150 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE 3.0 CM DE ESPESOR COMPACTOS TEXTURA FINA CON MATERIAL TRITURADO DE CALIZA CON GRANULOMETRIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CMS DE DIMENSION Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL ANTIVANDALICO COLOR MORADO, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: **DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **20A43568 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$327,112.01**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: **DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **20A43567 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$981,336.02**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
 Compañía Afianzadora: **DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **20A43568 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$13,681.64**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: **DORAMA, INSITUCION DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **20A43568 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
 Importe: **\$340,793.65**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

(Firmas manuscritas)



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$3,304,161.65	\$3,304,161.65	\$3,304,161.65	-	-
Inversión Ejercida	\$3,407,936.50	\$3,407,936.50	\$3,407,946.50	-	-
Saldo	-\$103,774.85	-\$103,774.85	-\$103,774.85	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$981,336.02**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/09/20 AL 03/10/20	557,366.31	1,300,521.40
01 EXTRA	09/09/20 AL 03/10/20	107,677.67	251,247.90
02 NORMAL	04/10/20 AL 19/10/20	316,292.04	423,259.58
01 ADITIVA	04/10/20 AL 19/10/20	0.00	224,366.92
03 NORMAL	20/10/20 AL 04/11/20	0.00	184,662.13
02 EXTRA	20/10/20 AL 04/11/20	0.00	42,542.55
Sub-Total		\$981,336.02	2,426,600.48
		Total	\$3,407,936.50

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **02** de **DICIEMBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

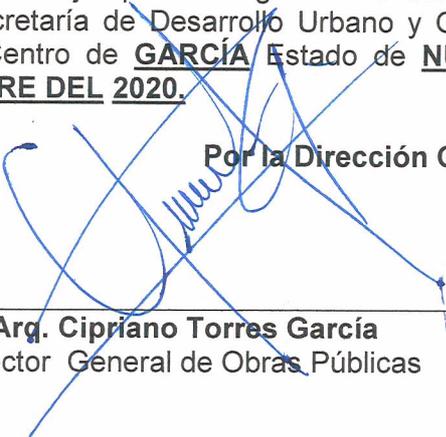

Arg. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas


Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal



C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

"POR EL CONTRATISTA"



Isauro Narvaez Yepiz
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-48/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**
