



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2020 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-29/20-IR Nombre de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR CONTIGUO A CANAL PLUVIAL”.

Localidad: SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-29/20-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020.

Fecha de Adjudicación: 10 DE JULIO DE 2020

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-29/20-IR DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020

Monto Original Contratado: \$ 2,454,931.34

Monto Total de Convenios: \$ - 49.37

Monto Ejercido de la Obra: \$ 2,454,881.97

1/4



Contratista: CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 13/07/2020 Fecha de terminación: 10/10/2020
Fecha real de inicio: 13/07/2020 Fecha real de terminación: 10/09/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA DE ACERO, DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE EN MAL ESTADO, REHABILITACION DE GUARNICION EXISTENTE A BASE DE RESANES CON CEMENTO -ARENA FINA, DESINSTALACION DE MOBILIARIO URBANO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE FIRME "ESTAMPADO" DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCION DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL, DESINSTALACION Y RETIRO DE MALLA DAÑADA FIJADA A PUENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE PVC FIJADA A PUENTE, ROTULACION DE ANUNCIO EN PUENTE PEATONAL, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, COLOCACION DE PASTO NATURAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, COLOCACION DE ARBOL DE HASTA 8" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE BARANDAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, LIJADO, FONDEADO Y PINTURA DE ARBOTANTE DE 7.5 MTS DE ALTURA Y BRAZO TIPO CHURUBUSCO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL ANTIVANDALICO COLOR MORADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2451510 10 DE JULIO DE 2020
Importe: \$245,493.13
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 24515105 10 DE JULIO DE 2020
Importe: \$736,479.40
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2451510 10 DE JULIO DE 2020
Importe: \$245,493.13
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$2,474,285.67	\$2,474,285.67	\$2,474,285.67	-	-
Inversión Ejercida	\$2,454,881.97	\$2,454,881.97	\$2,454,881.97	-	-
Saldo	\$19,403.70	\$19,403.70	\$19,403.70	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$736,479.40**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	13/07/20 AL 11/08/20	192,399.58	448,932.35
02 NORMAL	12/08/20 AL 26/08/20	404,380.55	943,554.62
01 ADITIVA	12/08/20 AL 26/08/20	57,103.29	133,241.00
03 NORMAL	27/08/20 AL 10/09/20	82,595.99	192,674.60
Sub-Total		\$736,479.41	\$1,718,402.57
		Total	\$2,454,881.97

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **15** de **OCTUBRE DEL 2020.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

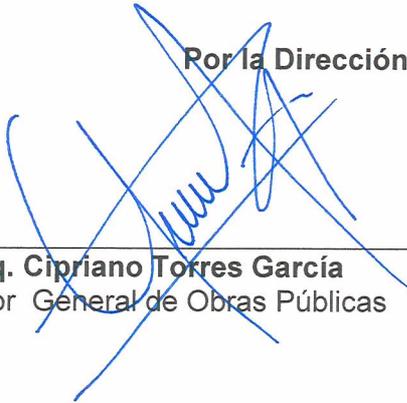


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas


Por la Secretaría de Servicios Públicos



Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal



C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”



Marclano González Jiménez
Representante Legal
**CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE
C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-29/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.**
