



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
ULTRACRECIMIENTO,  
EJERCICIO 2020

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-20/20-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y  
CANCHA POLIVALENTE UBICADA  
EN AV. LOS PARQUES ENTRE  
CALLES ARGON Y BROMO EN COL.  
LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA EN AV. LOS PARQUES  
ENTRE CALLES ARGON Y BROMO EN  
COL. LOS PARQUES.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-20/20-IR DE FECHA 09  
DE JUNIO DE 2020.

Fecha de Adjudicación:

12 DE JUNIO DE 2020

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-20/20-IR DE FECHA 12  
DE JUNIO DE 2020

Monto Original Contratado:

\$ 1,410,530.00

Monto Total de Convenios:

\$ -18.25

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,410,511.75



Contratista: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/06/2020 Fecha de terminación: 13/08/2020  
 Fecha real de inicio: 15/06/2020 Fecha real de terminación: 30/07/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, RAMPA DE CONCRETO, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO ELIPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE TIPO POSTE, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1,, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 20A25696 DEL 12 DE JUNIO DE 2020  
 Importe: \$141,053.00  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
 Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 20A25692 DEL 12 DE JUNIO DE 2020  
 Importe: \$423,159.00  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 20A25696 DEL 12 DE JUNIO DE 2020  
 Importe: \$141,053.00  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,427,849.50	\$1,427,849.50	\$1,427,849.50	-	-
Inversión Ejercida	\$1,410,511.75	\$1,410,511.75	\$1,410,511.75	-	-
Saldo	\$17,337.75	\$17,337.75	\$17,337.75	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$423,159.01**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/06/20 AL 13/07/20	423,159.01	822,551.15
01 ADITIVA	15/06/20 AL 13/07/20	0.00	146,041.17
01 EXTRA	14/07/20 AL 30/07/20	0.00	18,760.42
	<b>Sub-Total</b>	423,159.01	\$987,352.74
		<b>Total</b>	<b>\$1,410,511.75</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **24** de **AGOSTO DEL 2020**.

**Por la Dirección General de Obras Públicas**



**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas



**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

**Por la Secretaría de Servicios Públicos**



**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Supervisor de Obra


**Nombre, firma y cargo**

**Por la Contraloría Municipal**

**“POR EL CONTRATISTA”**



**C.P. Liliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

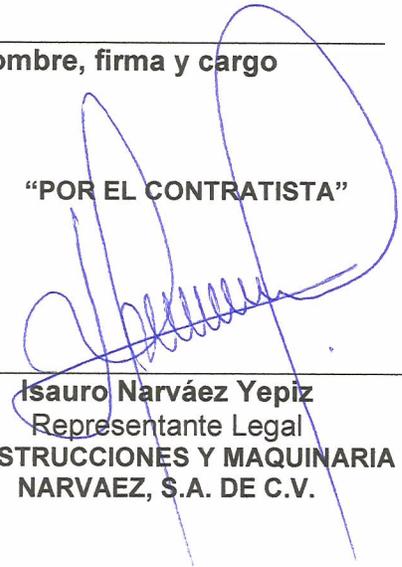

**Isauro Narváez Yepiz**  
Representante Legal  
**CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-20/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**
