



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-24/20-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-24/20-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>10 DE JULIO DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-24/20-IR DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,083,514.40</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ -20,547.60</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,062,966.80</u>

1/4



Contratista: CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 13/07/2020 Fecha de terminación: 10/10/2020
 Fecha real de inicio: 13/07/2020 Fecha real de terminación: 26/08/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECÁNICO, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20 X 18 CM, JUNTAS A CADA 3 MTS., CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X150 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS (SEGUN DETALLE), CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE 3.0 CM DE ESPESOR COMPACTOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CMS DE DIMENSION Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 7.5 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, XLP 600 VOLTS, 90 °C ANTI FLAMA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A31613 DEL 13 DE JULIO DE 2020
 Importe: \$108,351.44
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A31612 DEL 13 DE JULIO DE 2020
 Importe: \$325,054.32
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
 Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: 20A31613 DEL 13 DE JULIO DE 2020
 Importe: \$108,351.44
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$1,095,565.80	\$1,095,565.80	\$1,095,565.80	-	-
Inversión Ejercida	\$1,062,966.80	\$1,062,966.80	\$1,062,966.80	-	-
Saldo	\$32,599.00	\$32,599.00	\$32,599.00	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$325,054.32**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	13/07/20 AL 11/08/20	325,054.32	608,284.04
01 ADITIVA	13/07/20 AL 11/08/20	0.00	43,162.35
01 EXTRA	12/08/20 AL 26/08/20	0.00	86,466.09
Sub-Total		\$325,054.32	\$737,912.48
		Total	\$1,062,966.80

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4

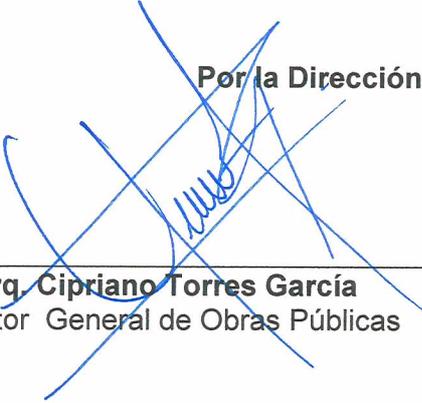



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **02** de **OCTUBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Alberto Mauricio Aspuru Gonzalez
Representante Legal
CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA,
S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-24/20-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V.**
