



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2020 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-27/20-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FU-27/20-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020.

Fecha de Adjudicación: 10 DE JULIO DE 2020

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FU-27/20-IR DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020

Monto Original Contratado: \$ 903,345.65

Monto Total de Convenios: \$ -9,776.88

Monto Ejercido de la Obra: \$ 893,568.77

1/4



Contratista: MATERPETROL, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 13/07/2020 Fecha de terminación: 10/09/2020
Fecha real de inicio: 13/07/2020 Fecha real de terminación: 10/09/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE. DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES. AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%. CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20 X 18 CM. JUNTAS A CADA 3 MTS., CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE 3.0 CM DE ESPESOR COMPACTOS TEXTURA FINA CON MATERIAL TRITURADO DE CALIZA CON GRANULOMETRIA APROBADA POR EL LABORATORIO. EXTENDIDA CON CARPETEADORA Y COMPACTADA AL 95% MARSHALL SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X150 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS (SEGUN DETALLE) CON REFUERZOS METALICOS ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" DE DIAM CED. 30, ESMALTADO. SEGUN DETALLE DE PLANO. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA. BANQUETA DE CONCRETO Premezclado. BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CMS DE DIMENSION Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 7.5 M. DE ALTURA. CON ACCESORIOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO. SEGUN NORMA CFE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO. COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

2166464-0000 DEL 10 DE JULIO DE 2020

\$90,334.56

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

2166463-0000 DEL 10 DE JULIO DE 2020

\$271,003.70

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

2166464-0000 DEL 10 DE JULIO DE 2020

\$90,334.56

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$916,179.02	\$916,179.02	\$916,179.02	-	-
Inversión Ejercida	\$893,568.77	\$893,568.77	\$893,568.77	-	-
Saldo	\$22,610.25	\$22,610.25	\$22,610.25	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$271,003.69**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	13/07/20 AL 13/08/20	181,065.89	422,487.08
02 NORMAL	14/08/20 AL 10/09/20	89,937.80	196,429.12
01 ADITIVA	14/08/20 AL 10/09/20	0.00	3,648.88
	Sub-Total	\$271,003.69	\$622,565.08
		Total	\$893,568.77

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.


7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **MATERPETROL, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

  3/4  

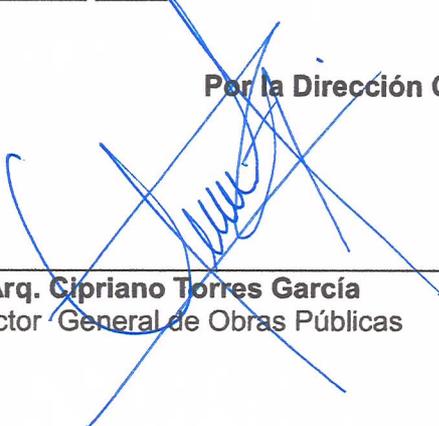


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **09** de **OCTUBRE DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.


Olga Lidia Vizcaino Aldape
Representante Legal
MATERPETROL, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FU-27/20-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MATERPETROL, S.A. DE C.V..
