

**RECIBIDO**  
01 NOV 2016  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
se recibe con anexos indicados

**RECIBIDO**  
01 NOV 2016  
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
se recibe con anexos indicados

SOP/MG/401/2016

LIC. JOSE CARLOS HERNANDEZ CABALLERO  
DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS  
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa del Fondo de Desarrollo Municipal, Fondo de Ultracrecimiento y Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros ejercicio 2016**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Septiembre del año 2016**.

**RECIBIDO**  
31 OCT 2016  
AUDITORIA SUPLENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
POR: Lic. Osvaldo Rojas HORA: 14:47

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

Oficio en copia simple y (2) anexos

ATENTAMENTE  
GARCIA, N.L. A 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

**RECIBIDO**  
31 OCT. 2016  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
Nora 1:35

**RECIBIDO**  
31 OCT 2016  
M. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
OFICIALIA MAYOR  
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
MONTERREY, NL  
14:07h

*[Handwritten Signature]*  
ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
SECRETARIO

**RECIBIDO**  
31 OCT 2016  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen\*

**RECIBIDO**  
31 OCT 2016  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
SUBSRIA. DE EGRESOS  
DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS  
1300h



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCIA  
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2016  
 PERIODO DEL 01/07/DE 2016 AL 30/09/ DE 2016.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )





FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	100%	100%	09/05/2016 AL 07/09/2016	2,475,440.00		2,475,440.00				2,401,176.81		2,401,176.81			M2	4,400			TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	100%	100%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,430,432.00		2,430,432.00				2,366,324.07		2,366,324.07			M2	4,320			TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCOLN ORIENTE DE GARCIA, N.L.	100%	100%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,334,790.00		2,334,790.00				2,288,575.59		2,288,575.59			M2	4,150			TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	4	CONSTRUCCION DE PLAZA ORQUIDEA.	EN COL. BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	30%	30%	13/09/2016 AL 31/12/2016	1,500,000.00		1,500,000.00				435,425.56		435,425.56			PLAZA	1			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	5	REHABILITACION DE PLAZA	EN COL. RIBERAS DE CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	30%	30%	13/09/2016 AL 31/12/2016	523,209.00		523,209.00				163,665.69		163,665.69			PLAZA	1			CONTRATADA			
SUMA DE LA HOJA								9,263,871.00		9,263,871.00				7,655,167.72		7,655,167.72										
SUBTOTAL								9,263,871.00		9,263,871.00				7,655,167.72		7,655,167.72										
SUMA TOTAL								9,263,871.00		9,263,871.00				7,655,167.72		7,655,167.72										



ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.  
 Nota 135  
 31 OCT. 2016  
 RECIBIDO

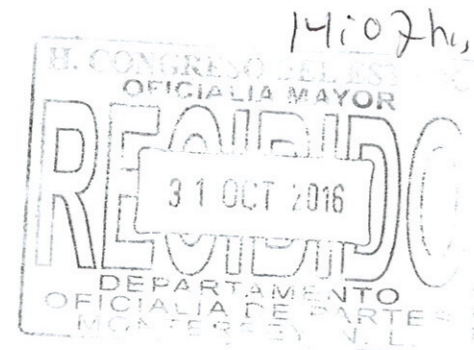



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2016  
 PERIODO DEL 01/07/DE 2016 AL 30/09/ DE 2016.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )




ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCIA  
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	AMPLIACIÓN DE AVE.	AVE ANILLO PERIFÉRICO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		7,024,490.00		7,024,490.00								M2	9,783.42			EN PROCESO DE LICITACION	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 1 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	20%	30%	21/09/2016 AL 20/12/2016	850,235.00		850,235.00			\$254,216.54		\$254,216.54			M	10			CONTRATADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 2 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	20%	30%	21/09/2016 AL 20/12/2016	1,000,000.00		1,000,000.00			\$300,371.74		\$300,371.74			M	10			CONTRATADA	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	4	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 3 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	20%	30%	21/09/2016 AL 20/12/2016	1,120,934.00		1,120,934.00			335,799.62		335,799.62			M	10			CONTRATADA	
SUMA DE LA HOJA								9,995,659.00		9,995,659.00			890,387.90		890,387.90								
SUBTOTAL								9,995,659.00		9,995,659.00			890,387.90		890,387.90								
SUMA TOTAL								9,995,659.00		9,995,659.00			890,387.90		890,387.90								

*[Signature]*  
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

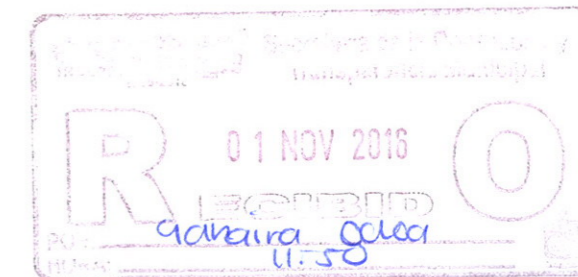



FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2016  
 PERIODO DEL 01/07/DE 2016 AL 30/09/ DE 2016.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
03	OCTUBRE	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA LIC. GENARO GARZA GARCIA	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	50%	30%	06/09/2016 AL 31/12/2016	225,882.00	225,882.00				67,693.97					M2	167.04			CONTRATADA				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ.	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	10%	30%	06/09/2016 AL 31/12/2016	403,656.00	403,656.00				121,550.08					M2	207			CONTRATADA				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO	EN COL. AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	30%	30%	06/09/2016 AL 31/12/2016	95,483.00	95,483.00				28,305.84					2	ANEXOS (BAÑOS)			CONTRATADA				
SUMA DE LA HOJA								725,021.00	725,021.00				217,549.89													
SUBTOTAL								725,021.00	725,021.00				217,549.89													
SUMA TOTAL								725,021.00	725,021.00				217,549.89													

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

