

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018



Dora 2:00 pm
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
16 NOV. 2017
RECIBIDO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
13:13 hrs.
16 NOV 2017
DEPARTAMENTO
OFICIALÍA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

SOP/MI/556/2017

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero ejercicio 2016, Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y Fondo Descentralizado del Ejercicio 2017. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2017.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
17 NOV 2017
RECIBIDO
POR: Susana Kargel
HORA: 10:51 a.m.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD Y
FINANZAS MUNICIPALES
17 NOV 2017
RECIBIDO
POR: Evelyn Loredo
HORA: 16:18

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
1:52
16 NOV 2017
RECIBIDO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRIA.
DE EGRESOS
16 NOV 2017
RECIBIDO
DIRECCION DE
ATENCIÓN A
MUNICIPIOS

ASENL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Lic. Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General / Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./Lic. Oscar Omar Treviño Moya / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal

16 NOV 2017
HORA: 15:04 hrs.
POR: Rosalva B.
www.garcia.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001
Tel. 8124 8800

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, EJERCICIO 2016

AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2016

PERÍODO DEL 01/07/DE 2017 AL 30/09/ DE 2017.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ	EN FRACC. PASEO DEL NOGAL (1ª Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	87%	15/12/2016 AL 14/04/2017	12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		11,244,079.02	8,679,304.60		2,564,774.42		ML	618.55			TERMINADA	
SUMA DE LA HOJA								12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		11,244,079.02	8,679,304.60		2,564,774.42							
SUBTOTAL								12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		11,244,079.02	8,679,304.60		2,564,774.42							
SUMA TOTAL								12,955,668.64	10,000,000.00		2,955,668.64		11,244,079.02	8,679,304.60		2,564,774.42							

[Handwritten Signature]
ING. JOSÉ EDUARDO FERRERA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2017
 PERIODO DEL 01/07/DE 2017 AL 30/09/ DE 2017.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)





ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	PAVIMENTACION DE CALLE	EN HIDALGO ENTRE AVE PROLONGACION LINCOLN Y LERDO DE TEJADA.	0%	30%	20/09/2017 AL 31/12/2017	3,142,416.21		3,142,416.21				941,760.21		941,760.21			M2	3,382			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	EN COL. RENACIMIENTO.	0%	30%	20/09/2017 AL 31/12/2017	3,146,632.10		3,146,632.10				\$943,144.88		\$943,144.88			Luminaria	78			CONTRATADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2017-CP	PAVIMENTACION DE CALLE	EN PROLONGACION MORELOS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		5,058,613.55		5,058,613.55				\$0.00		\$0.00			M2	3,382			EN PROCESO DE LICITACION			
SUMA DE LA HOJA								11,347,661.86		11,347,661.86				1,884,905.09		1,884,905.09										
SUBTOTAL								11,347,661.86		11,347,661.86				1,884,905.09		1,884,905.09										
SUMA TOTAL								11,347,661.86		11,347,661.86				1,884,905.09		1,884,905.09										



[Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO ESCOBAR DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

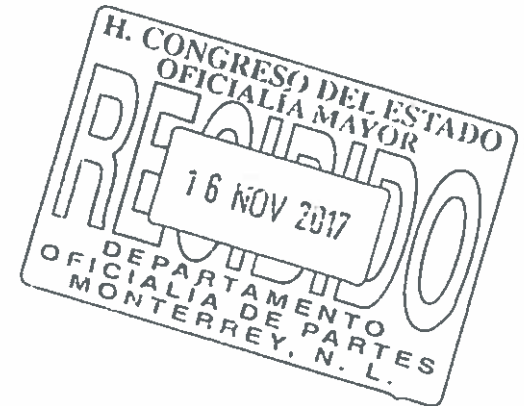

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2017

PERÍODO DEL 01/07/DE 2017 AL 30/09/ DE 2017.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISE-01/2017-IR	RED DE DRENAJE SANITARIO RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESCALONADAS DE CONCRETO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONAL CALLE NARANJO	EN CALLE BONIFACIO SALINAS C/C VENUSTIANO CARRANZA DE COL. JOSÉ PAEZ Y CALLE NARANJO COL. MIGUEL HIDALGO	0%	0%		2,576,429.77	2,576,429.77										DESCARGA DOMICILIARIA 25 TOMA DOMICILIARIA 15 M2 1197.76 LUMINARIAS 4 M2 924.02	EN PROCESO DE LICITACIÓN		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISE-02/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA.	EN COL. MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIV LA CUCHILLA COL. AMP. NOGALES	0%	0%		2,522,061.53	2,522,061.53										LUMINARIAS 26 ACOMETIDAS 32	EN PROCESO DE LICITACIÓN		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.	EN CALLE NOGAL COL. LOS NOGALES, CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO Y CALLE BALCONES DE LA SIERRA COL. VALLE DE SAN JOSÉ	0%	0%		1,993,000.00	1,993,000.00										M2 60 M2 1000 LUMINARIAS 5 PUENTE 1	EN PROCESO DE LICITACIÓN		
								SUMA DE LA HOJA	7,091,491.30	7,091,491.30				0.00	0.00							
								SUBTOTAL	7,091,491.30	7,091,491.30				0.00	0.00							
								SUMA TOTAL	7,091,491.30	7,091,491.30				0.00	0.00							

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
R 17 NOV 2017 O
 POR: _____
 HORA: _____

ASENL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
16 NOV 2017
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: _____

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
16 NOV 2017
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
16 NOV. 2017
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
R 17 NOV 2017 O
 POR: _____
 HORA: _____

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR
16 NOV 2017
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO OFICIALÍA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

FONDO DESCENTRALIZADO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2017
 PERIODO DEL 01/07/DE 2017 AL 30/09/ DE 2017.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DESCENTRALIZADO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FD-01/2017-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTÉTICO Y ADECUACIONES A PLAZA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA.	EN COL. SANTA MARÍA Y COL. VILLAS DEL PONIENTE	0%	0%		2,593,000.00		2,593,000.00								Plaza	2			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FD-02/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN CAMELLÓN	EN LAS VILLAS Y SAN SEBASTIAN	0%	0%		2,730,000.00		2,730,000.00								Plaza	2			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FD-03/2017-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZAS.	EN COL. SIERRA REAL Y PASEO DE LAS MINAS	0%	0%		1,800,000.00		1,800,000.00								Plaza	2			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FD-04/2017-IR	REHABILITACION DE AREAS ABIERTAS Y TECHADAS DE LA PLAZA.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA	0%	0%		2,877,000.00		2,877,000.00								Plaza	1			EN PROCESO DE LICITACIÓN			
SUMA DE LA HOJA								10,000,000.00		10,000,000.00				0.00		0.00									
SUBTOTAL								10,000,000.00		10,000,000.00				0.00		0.00									
SUMA TOTAL								10,000,000.00		10,000,000.00				0.00		0.00									

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 17 NOV 2017 **O**
 RECIBIDO

POR: _____
 HORA: _____

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

16 NOV. 2017

R RECIBIDO **O**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

16 NOV 2017

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

R 17 NOV 2017 **O**
 RECIBIDO

POR: _____
 HORA: _____

ASENL
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

16 NOV 2017

R RECIBIDO **O**

POR: _____ HORA: _____

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR

16 NOV 2017

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.
