





MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



11:10h





ING. HERNÁN GABRIEL AGUÍNAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2021. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de septiembre del año 2021

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS





ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 12 DE OCTUBRE DEL 2021

~~CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
c.c.p. Lic. María Teresa Herrera Tello / Encargada del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal

POR: [Signature]
HORA: 13:04



Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2021
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2021 AL 30/09/ DE 2021.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2021

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-20/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. IMPERIAL Y CALLES AVILÉS, UBEDA Y CORONA, COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN AGUSTÍN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1.135.524,50		1.135.524,50			1.118.408,57		1.118.408,57			M2	373,80			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-21/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLES SANTA ISABEL, SANTA INÉS, SANTA CRISTINA Y SANTA ANNA EN COL. RESIDENCIAL SANTA ELENA, GARCÍA, N.L.	100%	44%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1.010.450,56		1.010.450,56			443.883,91		443.883,91			M2	366,11			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-22/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES VALLE DE ORIÓN, VALLE DE OAXACA, VALLE DEL SOL Y VALLE DEL NILO DEL SECTOR M DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	44%	24/05/2021 AL 22/07/2021	759.843,54		759.843,54			332.197,49		332.197,49			M2	316,22			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-23/21-IR	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES VALLE DE CANARIO, VALLE DE CALIFORNIA, VALLE DE CEREZOS Y VALLE DE BALSAS DEL SECTOR 9 DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	98%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1.274.930,06		1.274.930,06			1.242.117,60		1.242.117,60			M2	392,00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-24/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PRESA AGUALEGUAS, ARROYO EL NEGRO Y PRESA CERRO PRIETO, COL. PORTAL DE LAS SIERRAS, GARCÍA, N.L.	100%	58%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1.753.719,17		1.753.719,17			1.013.025,65		1.013.025,65			M2	579,80			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, ENTRE CALLES NORTE, SUR, QUINTA Y SEXTA DE LA COL. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1.053.306,75		1.053.306,75			1.033.999,35		1.033.999,35			M2	624,00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE VILLA BURGOS, ENTRE VILLA VALENCIA Y VILLA CORUÑA, COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 06/08/2021	1.830.036,75		1.830.036,75			1.812.290,40		1.812.290,40			M2	644,84			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/21-IR	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS POLIVALENTES.	EN CALLES DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA ENTRE FERNANDO GUAJARDO Y HOSPITAL LAGUNA, Y EN CALLE DR. RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ ENTRE MATIAS GARCIA Y MAXIMILIANO RUIZEN LA COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	100%	98%	24/05/2021 AL 21/08/2021	3.371.316,76		3.371.316,76			3.264.532,70		3.264.532,70			M2	633,08			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES SAN PASCUAL Y MARAVILLAS, COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	929.782,06		929.782,06			915.487,64		915.487,64			M2	573,76			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-29/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PASEO DE RINCONADA Y PASEO DE LA ESTACIÓN, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 06/08/2021	1.859.872,04		1.859.872,04			1.908.621,41		1.908.621,41			M2	644,84			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-31/21-AD	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE PATINAJE CON OBSTACULOS.	PISTA DE PATINAJE EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", COL. SAN JOSE 3 SECTOR, GARCÍA, N.L.	100%	80%	17/05/2021 AL 15/06/2021	299.817,81		299.817,81			234.786,96		234.786,96			M2	79,85			Terminada	
SUMA DE LA HOJA								15.278.580,00		15.278.580,00			13.319.351,70		13.319.351,70								
SUBTOTAL								15.278.580,00		15.278.580,00			13.319.351,70		13.319.351,70								
SUMA TOTAL								15.278.580,00		15.278.580,00			13.319.351,70		13.319.351,70								



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL







ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2021
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2021 AL 30/09/ DE 2021.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-32/21-IR	ADECUACIÓN VIAL.	EN PUENTE SOBRE AV. VILLAZUL PARA DAR VUELTA DERECHA EN SALIDA DE COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/06/2021 AL 03/09/2021	1.100.842,20		1.100.842,20					1.089.672,91		1.089.672,91			M2	178,20			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-33/21-IR	RECARPETEO EN CUERPO SUR.	DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA GARCÍA, N.L.	100%	65%	07/06/2021 AL 04/09/2021	3.401.604,00		3.401.604,00					3.264.031,98		3.264.031,98			M2	3.366,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-34/21-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y SOLUCIÓN PLUVIAL	EN LATERAL DE HEBERTO CASTILLO Y AV. LAS VILLAS EN COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	100%	50%	07/06/2021 AL 04/09/2021	2.912.690,72		2.912.690,72					1.450.360,87		1.450.360,87			M2	1.650,00			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN AV. PASEO DE LOS ALAMOS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A PASEO DE LOS ANGELES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	100%	96%	07/06/2021 AL 04/09/2021	3.380.825,12		3.380.825,12					3.373.887,22		3.373.887,22			M2	2.399,90			Terminada		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-36/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	DE CALLE FRAY ANDRES DE OLMO ENTRE CALLE GRANADA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. EL CEDRAL, GARCÍA, N.L.	100%	49%	07/06/2021 AL 04/09/2021	2.478.516,93		2.478.516,93					1.216.791,88		1.216.791,88			M2	2.287,00			Terminada		
SUMA DE LA HOJA								13.274.478,97		13.274.478,97				10.394.744,87		10.394.744,87										
SUBTOTAL								13.274.478,97		13.274.478,97				10.394.744,87		10.394.744,87										
SUMA TOTAL								13.274.478,97		13.274.478,97				10.394.744,87		10.394.744,87										

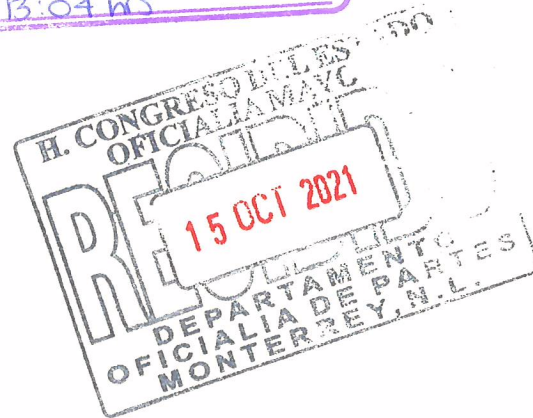

[Handwritten Signature]
 ARQ. CIRRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

R 15 OCT 2021 **O**
 RECIBIDO
 POR: Rosy R
 HORA: 13:04 hrs

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

García
 SOLOS FAMILIA 1921-2024
 15 OCT 2021

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2021
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2021 AL 30/09/ DE 2021.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA: 04
 MES: OCTUBRE
 AÑO: 2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	399,345.43		399,345.43				395,263.96		395,263.96	m2	330.95			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANÍA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	279,100.14		279,100.14				276,885.92		276,885.92	ml	18.30			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	206,952.99		206,952.99				199,999.76		199,999.76	m2	358.19			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	100%	100%	18/01/2021 AL 01/02/2021	120,913.61		120,913.61				118,237.88		118,237.88	pza.	3.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/21-IR	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	100%	60%	15/02/2021 AL 14/06/2021	3,542,363.52		3,542,363.52			2,101,296.99		2,101,296.99	ml	12,400.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA.	HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA REAL, GARCÍA, NUEVO LEON.	100%	100%	08/02/2021 AL 09/03/2021	416,470.82		416,470.82				408,140.90		408,140.90	m2	680.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR.	EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	100%	88%	22/03/2021 AL 20/05/2021	2,984,361.53		2,984,361.53			2,589,341.76		2,589,341.76	m2	1,459.98				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/21-IR	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTÉTICA.	EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFÉRICO, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1,990,375.73		1,990,375.73			1,968,480.42		1,968,480.42	m2	1,885.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO.	EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	22/03/2021 AL 20/05/2021	1,046,985.27		1,046,985.27			1,194,540.88		1,194,540.88	m2	82.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-13/21-AD	PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA.	EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.	100%	100%	31/03/2021 AL 14/04/2021	161,315.01		161,315.01				157,955.29		157,955.29	pza.	1.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/21-AD	REPARACION DE VALIADAD DAÑADA.	EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/04/2021 AL 15/04/2021	128,824.81		128,824.81				125,602.26		125,602.26	m2	233.32			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/21-AD	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE RÍVERAS Y ZIRAHUEN, COL. PARAJE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	100%	100%	26/04/2021 AL 03/05/2021	585,770.58		585,770.58			566,506.04		566,506.04	ml	23.50				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-17/21-AD	REPARACION DE DESLAVE.	EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	26/04/2021 AL 03/05/2021	202,377.91		202,377.91			192,478.28		192,478.28	m2	93.52				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-18/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL.	CALLE VALLE DE LERMA Y BANDA PERIMETRAL DEL SECTOR "1" EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	10/05/2021 AL 08/07/2021	899,013.13		899,013.13			899,005.05		899,005.05	m2	485.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-30/21-IR	MUROS DE CONTENCIÓN EN CANAL PLUVIAL.	CALLE MINERIA ENTRE MINERAS Y REAL DE MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	24/05/2021 AL 22/07/2021	1,772,286.14		1,772,286.14			2,399,095.24		2,399,095.24	ml	74.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-37/21-AD	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMELLÓN CON ANDADOR " MIGUEL HIDALGO" EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	25/05/2021 AL 08/06/2021	240,263.49		240,263.49			235,609.90		235,609.90	pza.	6.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-38/21-AD	ILUMINACIÓN DE ANDADORES PEATONALES.	EN PLAZA CALLE SIERRA DEL VALLE ENTRE SIERRA NEVADA Y SIERRA MADRE ORIENTAL, COL. SIERRA REAL, PRIMER SECTOR, GARCÍA, N.L.	100%	100%	07/05/2021 AL 21/06/2021	415,080.82		415,080.82			410,909.22		410,909.22	pza.	11.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-39/21-AD	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	31/05/2021 AL 14/06/2021	416,281.17		416,281.17			411,488.42		411,488.42	pza.	133.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-40/21-AD	ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADORES PEATONALES.	PARQUE LINEAL, CAPELLANÍA ENTRE CALLES MARAVILLAS Y SIERRA PERIFÉRICO, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	28/06/2021 AL 12/07/2021	415,292.92		415,292.92			411,970.87		411,970.87	pza.	9.00				Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-45/21-AD	RETRO DE MATERIAL DE ARRASRE COMPACTADO BAJO PUENTES QUE PONEN EN RIESGO E INSEGURIDAD A LA CIUDADANÍA POR INUNDACION.	EN AV. MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	26/07/2021 AL 04/08/2021	745,425.26		745,425.26			736,479.36		736,479.36	m3	1,600.00				Terminada	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
R 15 OCT 2021 **O**
 RECIBIDO
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GOBIERNAMENTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
R 15 OCT 2021 **O**
 RECIBIDO
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

SECRETARÍA DE Bienestar
 15 OCT 2021
 Delegación Nuevo León

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS - %	FIN - %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-38/21-AD	BANQUETA PEATONAL.	ENTRE AV.LINCOLN Y PROLONGACION RUIZ CORTINEZ, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, GARCIA, N.L.	100%	82%	19/08/2021 AL 17/09/2021	416,209.86		416,209.86			255,828.80		255,828.80		m2	587.49			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-62/21-AD	REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN COL. LAS ALAMEDAS Y COL. LAS BRISAS, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	390,306.49		390,306.49			383,411.00		383,411.00		pza.	88.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-53/21-AD	COLOCACION DE ARBOTANTES DOBLE CURVO Y SENCILLO CURVO.	EN COL. PARQUES DIAMANTE, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	249,103.90		249,103.90			240,763.56		240,763.56		pza.	6.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-64/21-AD	RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	388,398.49		388,398.49			385,897.20		385,897.20		m2	319.15			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-65/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	AV. JARDIN DE LAS LOMAS ENTRE BOSQUE CATALAN Y MONTE NISA, COL. VALLE DE CUMBRES PRIMER SECTOR, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	307,635.90		307,635.90			304,560.49		304,560.49		m2	148.76			Terminada	
SUMA DE LA HOJA								18,720,457.74		18,720,457.74			17,369,549.25		17,369,549.25							
SUBTOTAL								18,720,457.74		18,720,457.74			17,369,549.25		17,369,549.25							
SUMA TOTAL								18,720,457.74		18,720,457.74			17,369,549.25		17,369,549.25							

